

天竜川橋りょうほか新設 工事だより

組合回覧
天竜川JV

拝啓


春暖の候、皆さま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。

工事は、引き続き、天竜川河川内において橋脚と上部工工事、竜東一貫道路の東側において高架橋の基礎工事を行っています。竜東一貫道路の西側でも、高架橋の基礎工事に着手しました。なお、基礎工事が発生する土砂の運搬は4月後半からに変更し、村道115号の交通規制(約3週間の終日通行止め)は5月に変更しました。以前からお知らせしております竜東一貫道路の交通規制は、確定次第ご連絡します。(詳細は裏面を参照してください)。

引き続き、安全・環境に十分な配慮を行いながら工事を進めてまいりますので、これからもご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

工事の状況

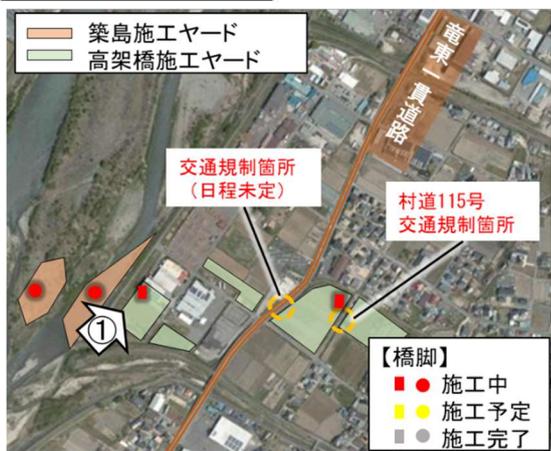

工事箇所全体図



基礎工事の様子

※本線工事のヤード等として、一部の土地を借地して使用させていただきたいと考えております。ご協力いただきたい方にはご相談に伺います。

工程表

工種		令和5年			
		4月	5月	6月	7月
竜東一貫道路東側	施工ヤード整備	[Blue bar]			
	橋脚工	[Blue bar]			
竜東一貫道路西側	橋脚工	[Blue bar]			
天竜川河川内	橋脚工・上部工	[Blue bar]			

※天竜川河川内の工事は、河川の水量が少ない時期(非出水期)に行う必要があり、工期に余裕がないため日曜日に作業を行わせていただく場合があります。

工事車両の運搬



○資機材(コンクリート除く)運搬時間: 6時~19時
(特殊車両: 法令により 21時~5時)

○発生土運搬車両には、《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。

○河川内の橋脚工事で4/20(木)にコンクリート打設を予定しています。また、コンクリートの運搬・打設作業は6時~20時を予定しています。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事故等に注意し、安全運行に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、工事の進捗等により日程、時間に変更になる場合は、事前に村内放送等でお知らせします。

喬木村内における主な工事用車両の運搬ルート

【天竜川工区】

資機材運搬台数

片道約 150台/日 (4、5月最大)

(コンクリート打設日：4/20)

※打設日を変更(4/25→20)しました。

【凡例】


- 天竜川工区
- 資機材(コンクリート除く)運搬ルート
- 資機材(コンクリート)運搬ルート
- 発生土運搬ルート



村道115号交通規制箇所詳細 (5月中旬～下旬)



交通規制箇所詳細 (日程未定)

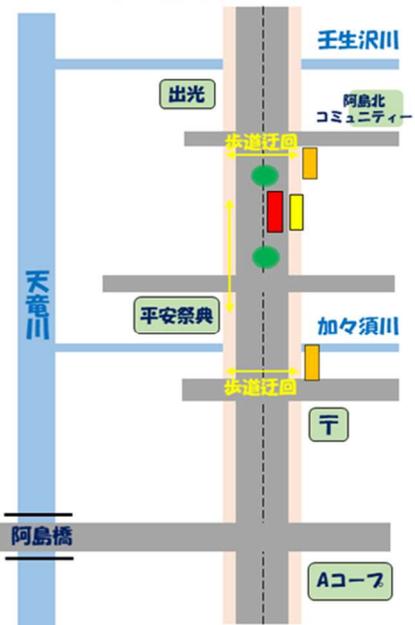

- 歩道迂回案内看板
- 交通誘導員
- 歩道通行止め(終日)
- 片側交互通行(昼間)

※資機材(コンクリート除く)の、竜東一貫道路等の幹線道路の運搬ルートは、仕入先により異なるため記載していません。

※交通規制の詳細については、後日あらためて看板等にてお知らせいたします。

【天竜川工区に関する問合せ先】

施工業者 : 天竜川JV

(三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設工事共同企業体)

現場事務所 : 喬木村400-61

電話番号 : 0265-48-6704(9:00~18:00 土日・祝日・長期連休を除く)
