

天竜川橋りょうほか新設 工事だより

組合回覧

天竜川JV


拝啓 梅雨が明け、暑い夏となりましたが、みなさま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。
高架橋区間においては、引き続き基礎工事を行っています。また、土井場沢川北側で7月後半より仮橋設置のためのヤード整備に着手します。ヤード整備に伴い、村道106号を一日当たり数台、工事用車両が通行します。

先月号でお知らせした交通規制のうち、竜東一貫道路の歩道規制は引き続き行います。今後、竜東一貫道路の西側の橋脚に着手するため、車線切替を行います。それに伴い、車道および歩道（東側）の交通規制を8月中旬頃、その後、車道および歩道（西側）の交通規制を9月中旬頃に行う予定です。詳細は確定次第ご連絡します（裏面参照）。

引き続き、安全・環境に十分な配慮を行いながら工事を進めてまいりますので、これからもご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事の状況

敬具

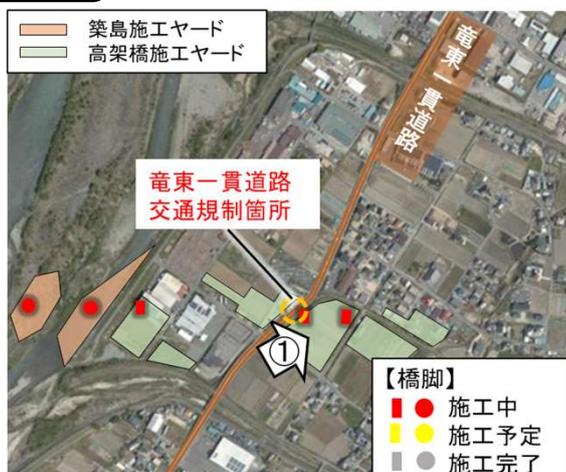

工事箇所全体図



竜東一貫道路東側の様子

※本線工事のヤード等として、一部の土地を借地して使用させていただきたくて考えております。ご協力いただきたい方にはご相談に伺います。

工程表

工種		令和5年			
		7月	8月	9月	10月
竜東一貫道路東側	施工ヤード整備		■		
	橋脚工	■			
竜東一貫道路西側	施工ヤード整備	■			
	橋脚工	■			
天竜川河川内	瀬替工、上部工				■

工事車両の運搬

中央新幹線 N-08

001

○資機材（コンクリート除く）運搬時間：6時～19時
（特殊車両：法令により21時～5時）

○発生土運搬車両には、《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。

○基礎工事で7/20(木)にコンクリート打設を予定しています。また、コンクリートの運搬・打設作業は6時～20時を予定しています。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事故等に注意し、安全運行に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、工事の進捗等により日程、時間に変更になる場合は、事前に村内放送等でお知らせします。

【天竜川工区】

資機材運搬台数


片道約 150台/日 (7、8月最大)

(コンクリート打設日：7/20)

※天候不良により打設日を変更しました。

〔凡例〕

- 天竜川工区
- 資機材 (コンクリート除く) 運搬ルート
- 資機材 (コンクリート) 運搬ルート
- ⋯⋯ 発生土運搬ルート

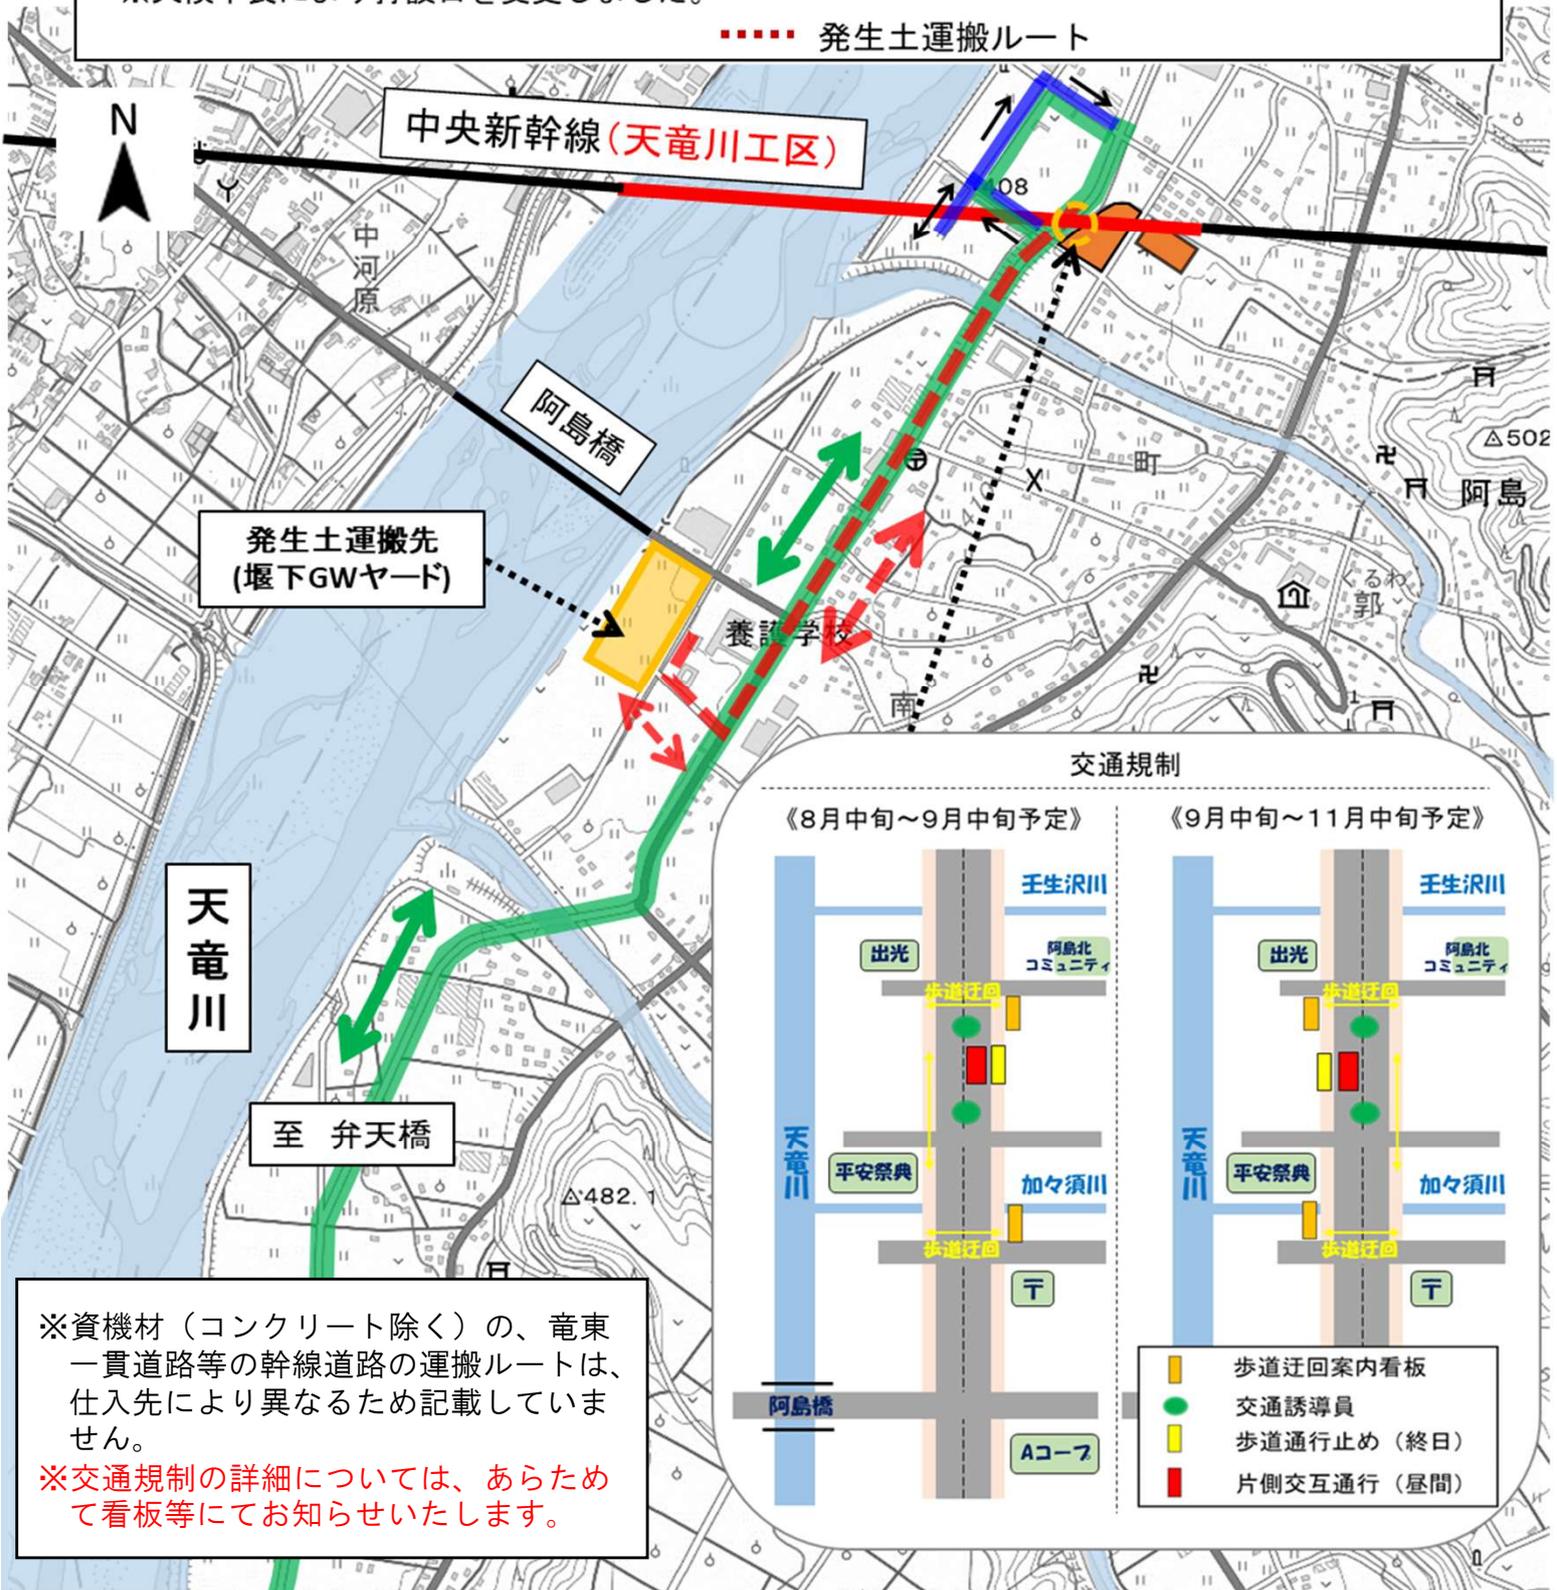

※資機材 (コンクリート除く) の、竜東一貫道路等の幹線道路の運搬ルートは、仕入先により異なるため記載していません。

※交通規制の詳細については、あらかじめ看板等にてお知らせいたします。

【天竜川工区に関する問い合わせ先】

施工業者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体
 (構成員：三井住友建設(株)・極東興和(株)・ドーピー建設工業(株)・吉川建設(株))
 現場事務所：喬木村400-61
 電話番号：0265-48-6704 (9:00～18:00 土日・祝日・長期連休を除く)
