



8月に入り厳しい暑さが続いておりますが、お健やかに過ごしてはいかがでしょうか。本夏はコロナ規制が緩和され、地方への外出が増えてきたと思います。先日地方へ旅行に行った際、食事処で「いただきました！」と言ったら定員さんに「・・・え？」と聞き返されたことがありました。私は飯田育ち、この方言は人情がにじみ出てとてもいい言葉だと思います。そのため今回はこの飯田市・下伊那地域の方言について紹介します。普段の会話は方言か標準語かを理解すれば、旅行の先で役立つかもしれません。




飯田下伊那弁	意味	使用例
いただきました	ごちそうさまでした	食事後～
いってきました	ただいま	自宅へ帰った時～
おいでなんしょ	いらっしゃい	こっちにおいでなんしょ
ねやねや	混んでること	今日の祭りはねやねやだった
あいさ	間	〇〇は棚のあいさに入れといて
ほおる	投げる	ボールをこっちにほおってよ
ずく	こまめな	あの人はずくがないなあ～
・・・だにい	・・・ですね	そうなんだにい～
びちやる	捨てる	その野菜もうびちやってきて
ぼける	熟しすぎ、スカスカ	りんごはぼけてる
びしょったい	だらしない	あの子はほんとびしょったい
あんじゃねえ	だいじょうぶ	このくらいの暑さあんじゃねえ
ごしたい	疲れた、面倒だ	今日の仕事はごしたいな
ぬくとい	温かい	こたつはぬくとくて良いな
かな	ごめん	遅れちゃって、かな
へぼ	古い、弱い	この椅子はへぼいな
～さら	～ごと、そのまま	そのカゴさら取ってくれ
ごうがわく	頭にくる	そんなことでごうわかさないで
おかしま	正しく座る	ちゃんとおかしまして食べよ
こすい	ずるい	今のはこすいな
だだくさ	たくさん	だだくさ来ても困るよ
らんごく	散らかってる	また部屋をらんごくにしてる
なから	ある程度、大体	なからになるで休憩しよ
しみる	凍る、冷える	今日は道路がしみてるかも
こわい	硬い	この野菜はまだこわいね

# 令和3年度 三遠南信牛首沢道路建設工事


「令和3年度 三遠南信牛首沢道路建設工事」を施工しております、神稲建設株式会社です。昨年の7月半ばより工事に着手し先月の中頃、工事用道路である仮橋・仮栈橋工を完成することができました。引続き、仮橋・仮栈橋上にアスファルト舗装を舗設する工事を行っていきます。

工事に際しましては、工事車両の通行など周辺地域の皆様にはご迷惑をお掛けする事となりますが、安全には最新の注意を払い、工事を進めて参りますので引続きご理解とご協力をお願いいたします。

## 仮橋・仮栈橋工完成

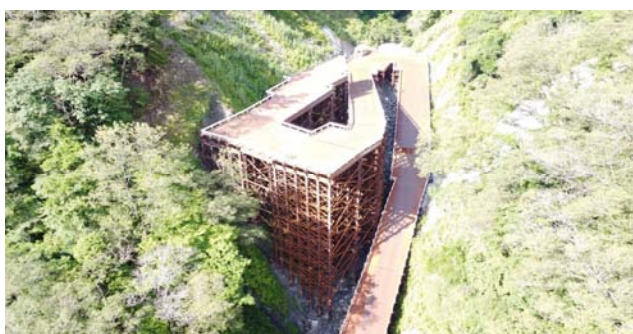

## 7月末進捗状況

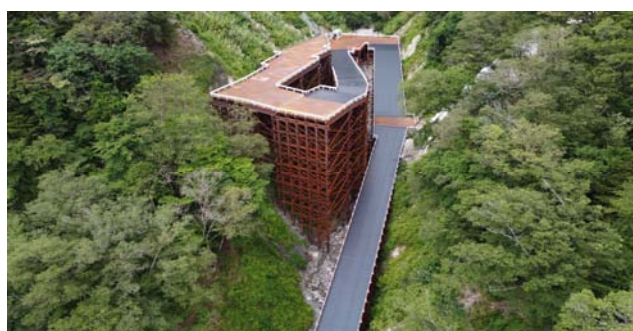

現場担当者  
現場代理人 片桐 巧  
監理技術者 仲田 俊司

本社 飯田市主税町18番地  
TEL 0265-59-7011  
FAX 0265-59-7044

工期 R4.3.31~R5.10.31

大地、そして人、未来を語り今を創る

KUMASHIRO




くましろ  
**神稲建設株式会社**

# 令和3年度 三遠南信小豆沢工事用道路建設工事

『令和3年度 三遠南信小豆沢工事用道路建設工事』を施工しております、株式会社ヤマウラです。本工事は、氏乗IC(仮称)～喬木IC 区間の小豆沢を渡河する橋の橋台と工事用道路(仮橋)の工事になります。

工事期間中、周辺地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全と環境に配慮し、一日でも早く完成できるよう工事を行いますので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

工事進捗状況 (令和5年7月末)

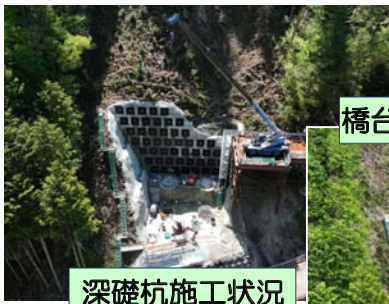

深礎杭施工状況



橋台コンクリート打設状況



完成イメージ図

A2橋台

工事用道路(仮橋)

## 工事概要

道路土工	1 式
擁壁工	1 式
橋台工	1 式
橋梁現場塗装工	1 式
仮設工	1 式

お気付きの点がありましたら  
下記までご連絡ください。


# 令和3年度 三遠南信7号橋下部工事

## 工事中間報告

「令和3年度 三遠南信7号橋下部工事」を施工しております、東急建設株式会社です。日頃より当工事にご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。引き続き『安全第一』『地域優先』『高品質な施工』に心掛けて工事に取り組んで参ります。

### 現在の進捗状況

P1・P2橋脚ともに基礎杭は完了し、地上部分の橋脚の施工を行っております。8月中旬以降に工事用道路として使用する仮栈橋の設置工事を開始する予定です。

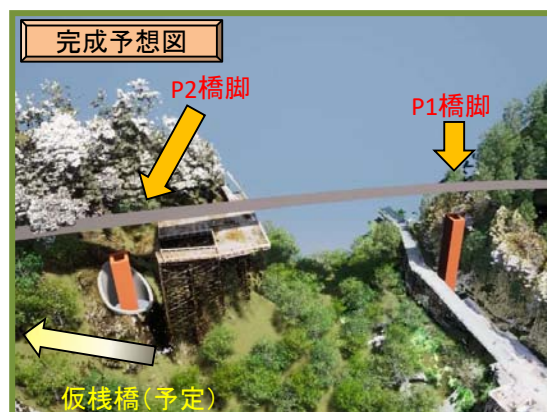

美しい時代へ — 東急グループ  
**東急建設株式会社**

【現場事務所】 長野県下伊那郡喬木村氏乗11020-1  
TEL 0265-49-4317 FAX 0265-49-4318

【現場担当者】

現場代理人：鈴木 元太

監理技術者：水井 隆之

# 令和3年度 三遠南信8号橋下部工事

## 工事進捗状況

「令和3年度 三遠南信8号橋下部工事」を施工しております、若築建設(株)です。日頃より、本工事にご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。引き続き【安全な施工と現場環境】 【地域環境に配慮した工事の運営】 【高品質な構造物】を心掛け工事に取り組んでいきます。

### 現在の進捗状況

基礎杭の施工を行うために、山の斜面を垂直に掘り下げる工事を行っています。9月中旬頃より基礎杭の施工を開始する予定です。



『工事内容』  
三遠南信自動車道の一部を構成する飯橋道路の橋脚を1基(P3橋脚)作ります。

完成予想図



工事位置 (P3橋脚)

県道上飯田線北側よりの完成イメージ図

現場写真



豊かな未来へ 技術のメッセージ

## 若築建設

【現場担当者】

現場代理人 : 柳 基継

監理技術者 : 岩崎 真介

【現場事務所】長野県下伊那郡喬木村氏乗11324-7

TEL 0265-48-6912 FAX 0265-48-6913


# 令和4年度 三遠南信矢筈道路建設工事

『令和4年度 三遠南信矢筈道路建設工事』を施工しております、吉川建設株式会社です。  
日頃より本工事にご理解ご協力頂き誠にありがとうございます。現在、擁壁工（補強土壁）、排水構造物工（コルゲートパイプφ3000）の施工を行っています。8月下旬頃から土砂を現場に搬入するためダンプトラックの通行を予定しております。沿道の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、安全第一で工事の完成に努めて参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

## 【現況写真】



## 【イメージ図】

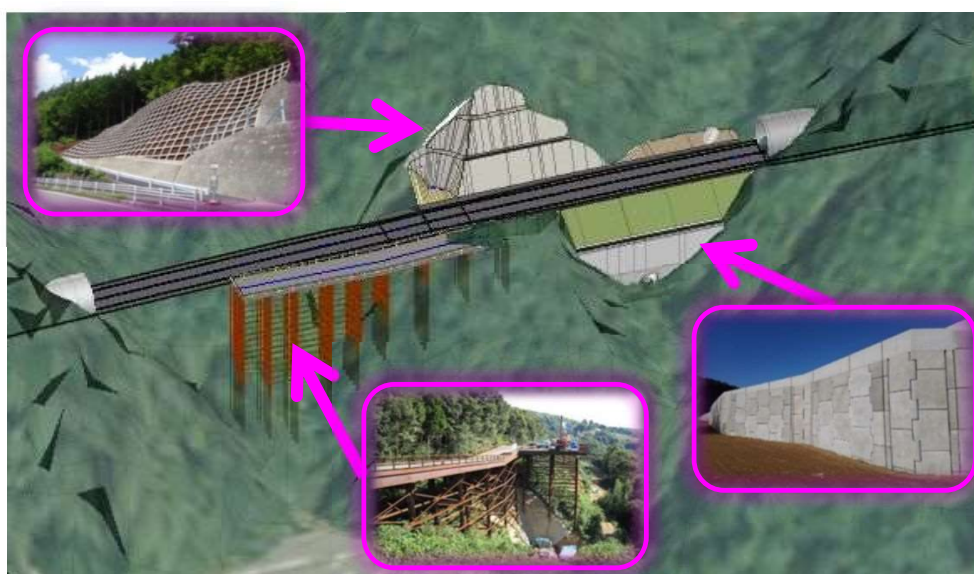

 **吉川建設株式会社**

現場代理人 木下 元輝  
監理技術者 倉科 大

【本社】

飯田市東和町二丁目35番地  
丘の上結いスクエア4階  
TEL 0265-22-3400  
FAX 0265-24-7710


# 令和4年度 三遠南信八重河内道路建設工事

## 工事完成のご挨拶

令和4年6月に着手しました本工事も、令和5年5月22日をもって、無事故無災害にて無事竣工することができました。

工事期間中、地元住民の皆様にはご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございました。心より感謝、御礼申し上げます。

### 工事完了(起点側より)

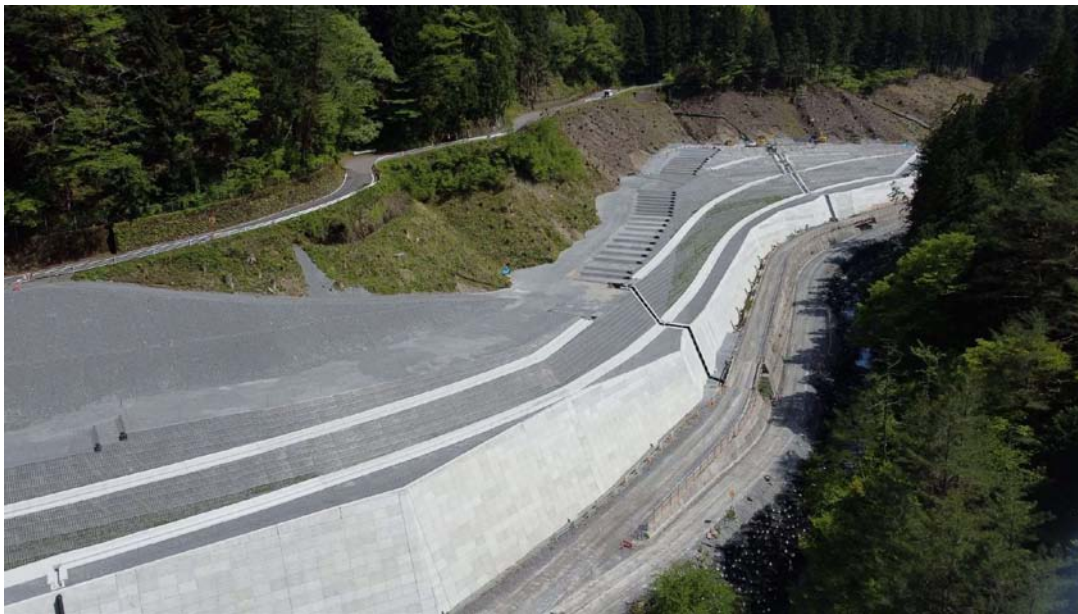

斜壁多数アンカー



ジオテキスタイル



**神稲建設株式会社**

【本社】飯田市主税町18番地

TEL 0265-59-7011

【現場事務所】R4八重河内道路作業所

TEL 0260-31-0085

【現場担当者】


現場代理人: 清水 優希

監理技術者: 増田 健治



# 令和5年度 三遠南信此田道路建設工事

工事着手のご挨拶

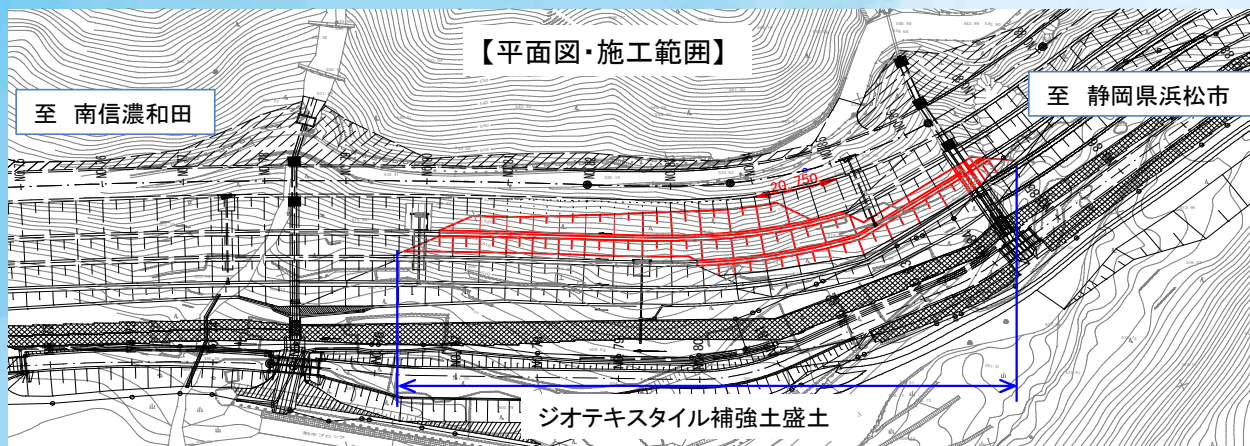

この度、「令和5年度 三遠南信此田道路建設工事」を施工することになりました小池建設株式会社です。今回の工事は青崩峠トンネル(仮称)の掘削残土を用いて八重河内地区の三遠南信自動車道を構築する工事です。盛土に際してはジオテキスタイル補強土盛土という工法を用います。盛土の中に写真のような補強材を何層にも渡って敷設します。工事期間中は工事車両の通行により地域の皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、安全最優先で工事を行いますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

盛土補強材(ジオグリッド)



令和5年度 三遠南信此田道路建設工事を施工致します  
小池建設株式会社です。安全第一で作業致しますので  
皆様のご理解ご協力よろしくお願い致します。


安全+第一

現場代理人 今村昭洋  
監理技術者 塚田健二

**KOIKE** 小池建設株式会社  
Civil Engineering

[本社]長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2  
TEL:0265-28-8100 FAX:0265-28-8101  
[現場事務所]飯田市南信濃八重河内575-2  
TEL・FAX 0260-34-0041



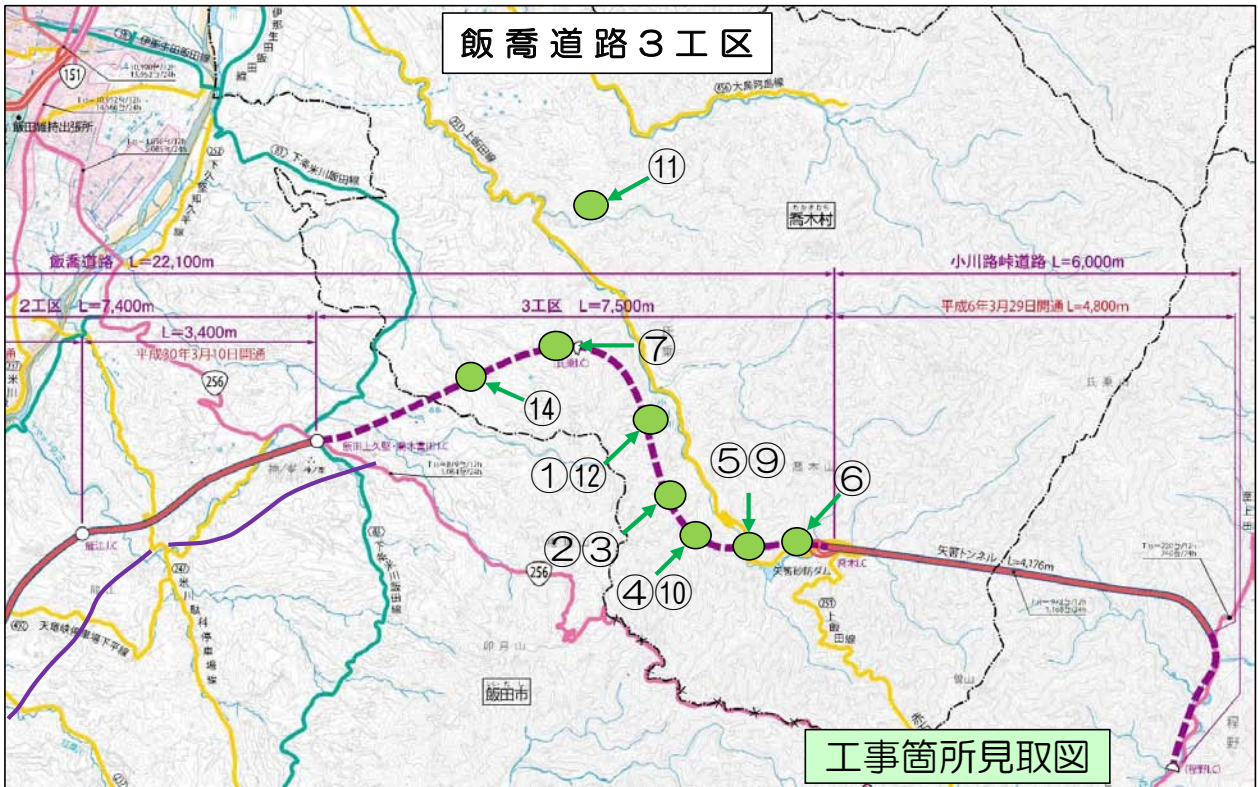

マーク番号	工事名	担当業者	工期	進捗率：7月末
①	令和3年度 三遠南信 牛首沢道路建設工事	神稲建設(株)	R4. 3.31 ~ R5.10.31	97.2 %
②	令和3年度 三遠南信 小豆沢工事用道路建設工事	(株)ヤマウラ	R4. 3.31 ~ R5. 8.31	97.5 %
③	令和3年度 三遠南信 6号橋下部工事	吉川建設(株)	R4. 3.14 ~ R5.12.28	83.8 %
④	令和3年度 三遠南信 7号橋下部工事	東急建設(株)	R3.11.24 ~ R6. 1.13	68.7 %
⑤	令和3年度 三遠南信 8号橋下部工事	若築建設(株)	R4. 3.17 ~ R5.11.16	23.0 %
⑥	令和4年度 三遠南信 矢筈道路建設工事	吉川建設(株)	R4. 8. 1 ~ R6. 5.31	7.5 %
⑦	令和4年度 三遠南信 氏乗道路建設工事	木下建設(株)	R5. 4. 3 ~ R6.12.28	0.0 %
⑧	令和4年度 三遠南信 6号橋鋼上部工事	矢田工業(株)	R5. 2.14 ~ R6. 2.28	3.0 %
⑨	令和4年度 三遠南信 矢筈工事用道路建設工事	(株)早野組	R5. 3.28 ~ R6.10.31	2.2 %
⑩	令和4年度 三遠南信 7号橋下部工事	吉川建設(株)	R5. 4. 3 ~ R6.12.28	0.0 %
⑪	令和4年度 三遠南信 飯喬道路整備工事	長豊建設(株)	R5. 4. 3 ~ R6. 2.28	5.2 %
⑫	令和4年度 三遠南信 6号トンネル工事	(株)大林組	R5. 3. 4 ~ R7. 2.28	0.0 %
⑬	令和4年度 三遠南信 8号橋下部工事	若築建設(株)	R5. 3.22 ~ R6.11. 2	6.4 %
⑭	令和4年度 三遠南信 富田道路建設工事	(株)ヤマウラ	R5. 4. 3 ~ R6. 2.28	0.0 %



三遠南信工事連絡協議会飯喬道路支部で、左記の看板を作成しました。この看板には、地籍名と地籍ごとに分けた食材（主にフルーツ）の絵が書かれています。Aの上久堅入口からHの矢筈入口まで計8箇所あり、道路沿線の現場入り口に設置し、各現場の場所をわかりやすくしました。

A：上久堅



E：牛首沢



B：小手沢・大入沢



F：小豆沢



C：くるみ



G：二日洞



D：雨沢



H：矢筈





番号	工事名	担当業者	工期	進捗率：7月末
①	平成30年度 三遠南信 池島トンネル本坑工事	(株)安藤・間	H30. 8.10 ~ R7. 3.24	74.8 %
②	平成30年度 三遠南信 小嵐トンネル本坑工事	五洋建設(株)	H30. 8. 9 ~ R6.11.10	96.0 %
③	令和4年度 三遠南信 此田道路建設工事	木下建設(株)	R4. 9. 1 ~ R5. 8.31	99.9 %
④	令和4年度 三遠南信 八重河内道路建設工事	神稲建設(株)	R4. 6.20 ~ R5. 6.30	100.0 %
⑤	令和5年度 三遠南信 此田道路建設工事	小池建設(株)	R5. 7.12 ~ R6. 2.29	0.0 %
⑥	令和4年度 三遠南信 小嵐道路建設工事	神稲建設(株)	R5. 3.22 ~ R6. 2.29	31.8 %
⑦	令和4年度 三遠南信 飯田国道管内道路整備工事	神稲建設(株)	R5. 4. 3 ~ R6. 2.28	24.0 %

【連絡先】

☆ 飯橋道路3工区

吉川建設(株) 三遠南信 7号橋下部工事作業所内  
 令和5年度 三遠南信工事連絡協議会  
 飯橋道路支部

TEL 050-5530-4469 FAX 050-5530-4469  
 E-mail : ys0849@yoshikawaken.co.jp

☆ 青崩峠道路工区

五洋建設(株) 三遠南信 小嵐トンネル本坑工事作業所内  
 令和5年度 三遠南信工事連絡協議会  
 青崩峠道路支部

TEL 0260-31-0511 FAX 0260-31-0512  
 E-mail : hidekazu.aoki@mail.penta-ocean.co.jp

