

大暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

8月といえばお盆休み・夏休み・花火大会・夏祭り・海水浴等様々なイベントがありワクワクする月ではないでしょうか。【夏祭り・花火大会】はこの下伊那地域でも現在多く開催されています。今回の記事では、飯田市 南信濃で今後開催されるお祭りについてご紹介したいと思います。

～風の祭りから花火大会へ、中世武士の祭典が今に伝わる～

【御射山祭り花火大会】 2024年開催日8/24(土)

御射山祭りは、和田と南和田の氏神である諏訪神社の祭礼です。以前は新暦の8月26日、27日の両日が祭日でしたが、現在では8月の第4土曜日となっています。

この御射山祭りでは南信濃の中心市街地である和田の町を、午後4時から子供や若者たちが趣向をこらした神輿を担ぎ、飯田信用金庫南信濃支店前を出発して和田商店街を練り歩く【キオイ】が行なわれます。その後、午後7時からは大煙火大会です。遠山谷の狭い空いっぱいに大きな花火が広がり、轟音が山にこだましておなかに響きます。遠山郷の夏の風物詩として皆様、是非一度訪れてみてはいかがでしょうか？



打ち上げ花火




御射山祭りを楽しむ人々たち  
写真提供：遠山郷観光協会

意外と知らなかった打ち上げ花火の形状種類とその名

いつも綺麗だなと見ている花火にもたくさんの形状がありますよね。皆様はご存じでしたでしょうか？柳・冠菊・椰子・千輪・菊小割・型物・蜂・牡丹等大きく分けて9種類あるそうです。

「あの花火の種類は何だろうか？」など考えながら見るとより一層楽しむことができそうですね。今年の花火は、その美しさに魅了だけでなく種類や見え方にも注目してみてもいいのではないでしょうか。

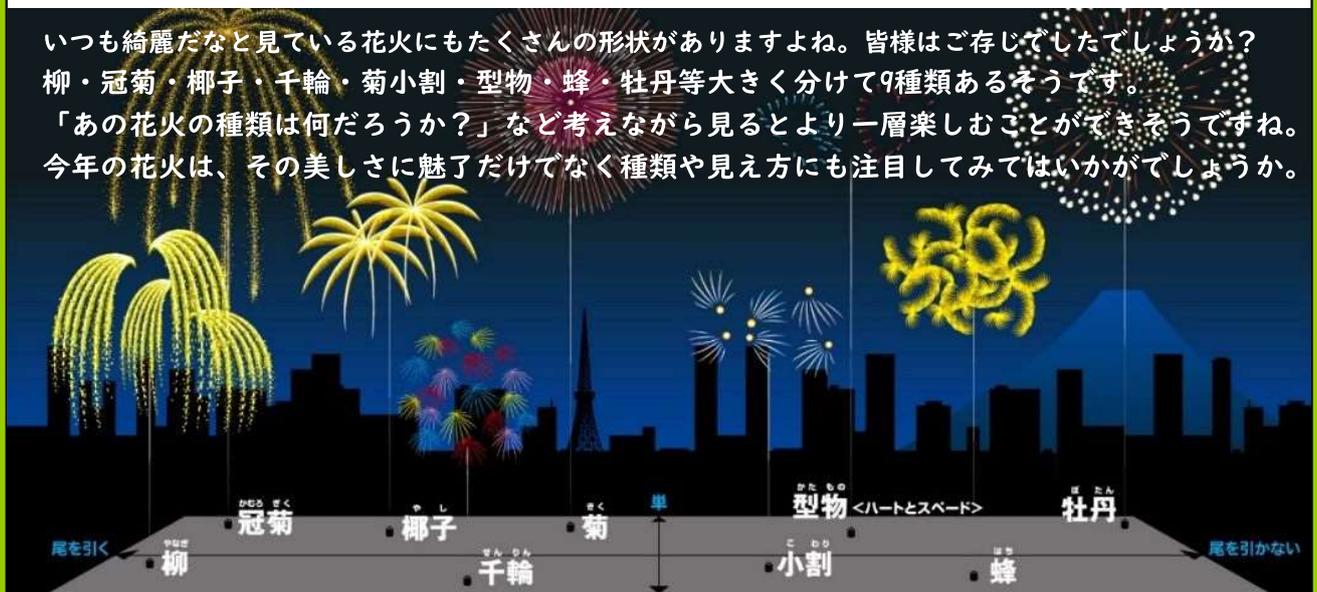

冠菊 椰子 菊 小割 牡丹  
柳 千輪 蜂  
尾を引く 尾を引かない

# 令和3年度 三遠南信8号橋下部工事

## 工事進捗状況

「令和3年度 三遠南信8号橋下部工事」を施工しております、若築建設(株)です。  
日頃より、本工事にご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。引き続き  
【安全な施工と現場環境】 【地域環境に配慮した工事の運営】 【高品質な構造物】  
を心掛け工事に取り組んでいきます。

### 現在の進捗状況

基礎杭の施工が完了し、橋脚の施工をおこなっています。  
橋脚高さ33mのうち15mまでコンクリートの打設が完了しました。



『工事内容』  
三遠南信自動  
車道の一部を構  
成する飯橋道路  
の橋脚を1基(P  
3橋脚)作ります。

完成予想図



県道上飯田線北側よりの完成イメージ図

現場写真



豊かな未来へ 技術のメッセージ

## 若築建設

【現場担当者】

現場代理人 : 柳 基継

監理技術者 : 岩崎 真介

【現場事務所】長野県下伊那郡喬木村氏乗11324-7

TEL 0265-48-6912 FAX 0265-48-6913

# 令和4年度 三遠南信氏乗道路建設工事

令和4年度 三遠南信氏乗道路建設工事を施工しております、木下建設株式会社です。現在、氏乗工事用道路部では掘削工事、樽沢本線盛土部では道路の基盤となる路体盛土工事を行っております。また残土処理工として胡桃沢残土処理場への土運搬も併せて行っております。工事期間中、近隣住民の皆様方にはご不便・ご迷惑をおかけするかとと思いますが、どうかご協力の程、宜しくお願い致します。



令和5年11月末現在

令和6年7月末現在

氏乗工事用道路掘削部



樽沢本線盛土部



 木下建設株式会社

飯田市松尾町1丁目22番地  
TEL0265-22-2780

【現場事務所】

長野県下伊那郡喬木村氏乗  
携帯080-7948-1817

【現場担当者】

現場代理人

吉川 剛

監理技術者

牧野内 淳志




# 令和4年度 三遠南信6号トンネル工事

【令和4年度 三遠南信6号トンネル工事】を施工しております、株式会社大林組です。本工事は、455mのトンネルをつくる工事です。現在、トンネル掘削が152m(7/18時点)完了しています。8月以降も引き続きトンネル掘削の施工予定です。工事期間中は、工事車両両通行等で近隣の皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、安全、環境を最優先し、工事を進めてまいりますのでご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



6号トンネル起点側イメージ図

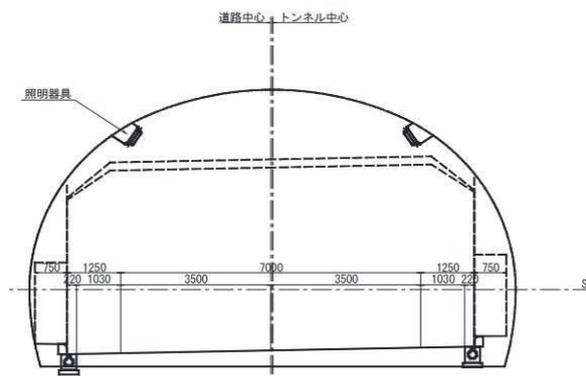

トンネル標準断面図




坑口ヤード全景



掘削作業状況



坑内全景



【三遠南信トンネル工事事務所】

TEL 0265-49-3531

FAX 0265-49-3532

現場代理人 中戸 敬明(080-2022-3232)

監理技術者 浅野 文典(080-5983-4029)



# 令和4年度 三遠南信8号橋下部工事

## 工事進捗状況

日頃より本工事に深いご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

令和5年5月より工事を開始し令和6年4月に掘削が完了、現在は基礎の鉄筋組立とコンクリートの打込み作業を行っています。令和6年11月までの工期となっていますが、少し早めに工事が完了する予定です。最後まで安全には十分に配慮して工事を進めます。引き続き、ご理解とご協力をお願い致します。

P2橋脚断面図

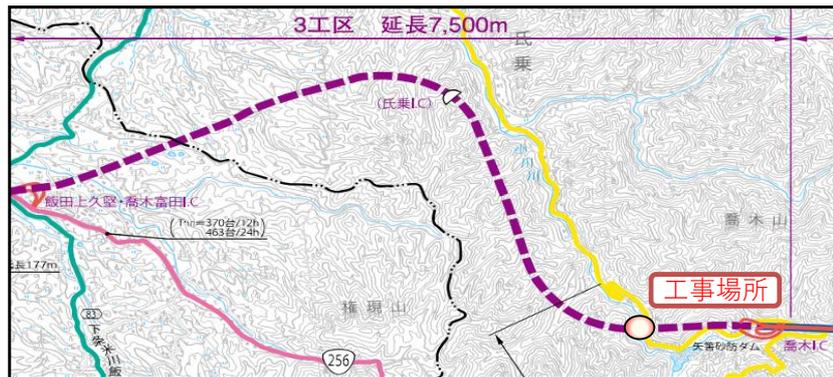

【着手して間もない頃 令和5年6月】



【令和6年4月】



【令和6年1月】



【令和6年7月】



豊かな未来へ 技術のメッセージ

## 若築建設

【名古屋支店】 愛知県名古屋市中区錦1-11-20  
TEL 052-201-5321 FAX 052-204-1597

【現場事務所】

下伊那郡喬木村氏乗11331-1  
TEL 0265-49-8502

【現場担当者】

現場代理人：坂本 康彰  
監理技術者：横道 晴行

# 令和5年度 三遠南信3号橋PC上部工事

日頃より、工事にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

本工事は、長さ171mのコンクリート製の橋を架ける工事です。令和6年1月より工事ヤードの整備から着手し、現在、橋脚1基が完了して柱頭部（橋脚上の橋梁部分）を施工しております。

8月には柱頭部の上に移動作業車を設置し、9月より順次両側に橋を伸ばしていく工事（張出し架設）を進めていく予定です。

引き続き、生コン車をはじめ、資材や機材を積んだトラックが多く通行することとなり、周辺地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全に配慮して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 令和6年 8月末時点 コンクリート打設完了箇所




上はこんな感じ！ここにコンクリートを打つと、車が走る部分になります！



P2柱頭部の施工状況

今後は・・・

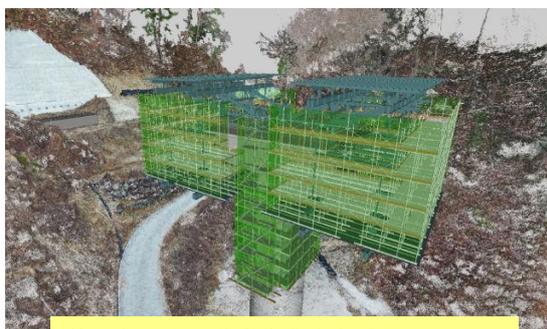

柱頭部の上に移動作業車を設置して・・・



3～4mずつ、両側に橋を伸ばしていきます。

 **オリエンタル白石株式会社**

【大阪支店】 大阪市西区江戸堀一丁目9番1号  
【名古屋営業支店】 名古屋市中区栄二丁目3番6号

【現場事務所】


飯田市上久堅678  
TEL 0265-49-3408  
現場代理人 木ノ本 昌之  
監理技術者 福島 夏樹

# 平成30年度 三遠南信池島トンネル本坑工事

平成30年度 三遠南信池島トンネル本坑工事を施工しております、安藤ハザマです。  
 長野県と静岡県にまたがる全長4988mのトンネルのうち、静岡県側工区(池島トンネル)L=2,144mを  
 施工しています。2019年7月よりトンネルを掘り始め、2023年5月26日に無事貫通しました。  
 その後インバート本体工の施工も1月に完了しました。覆工コンクリートは93%完了しております。  
 日頃から近隣住民の皆様におかれましては、搬入・搬出等の工事車両の通過でご迷惑おかけして  
 おります。引き続き安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い  
 致します。

## 進捗状況

トンネル全長 L=4,998m

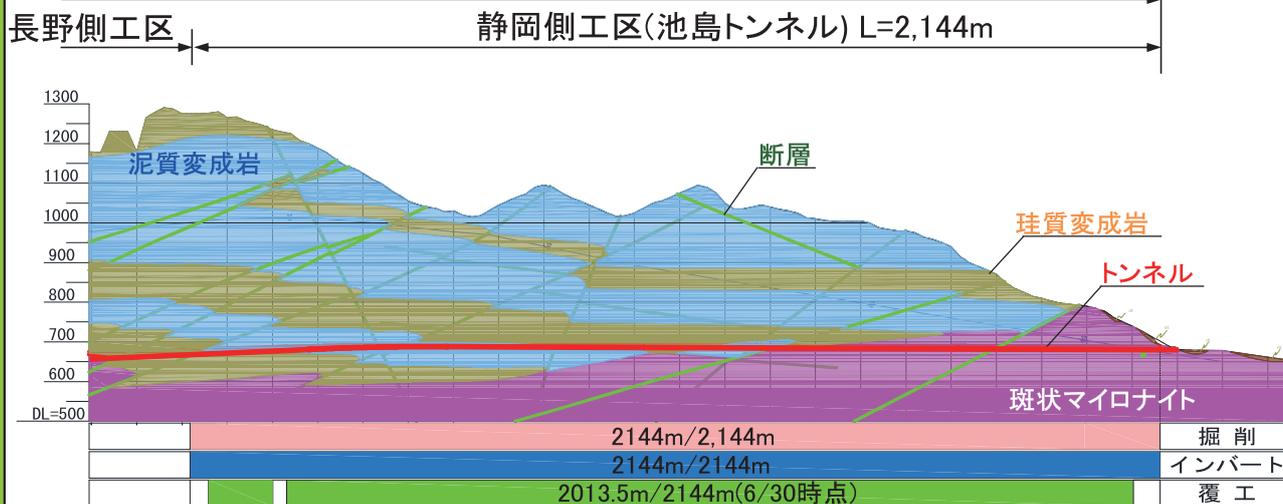

坑口状況



覆工コンクリート打設状況



安藤ハザマ

### ☐連絡先

#### 【名古屋支店】

〒460-0002

名古屋市中区丸の内1-8-20

TEL:052-204-1281

#### 【現場事務所】


〒431-4101

静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家5330-1

TEL:053-987-3560

監理技術者：小林 雄二

現場代理人：永井 亮真

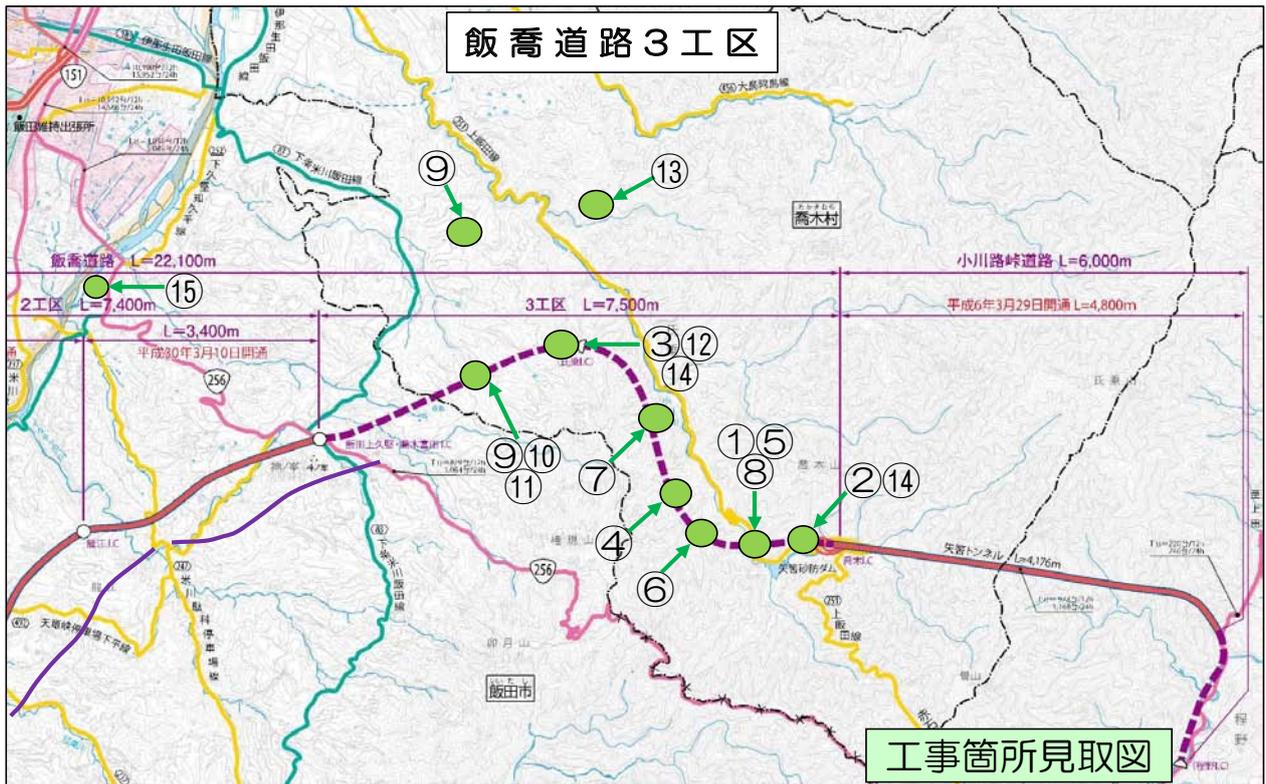

工事箇所見取図

マーク 番号	工事名	担当業者	工期	進捗率：7月末
①	令和3年度 三遠南信 8号橋下部工事	若築建設(株)	R4. 3. 17 ~ R6.11.29	83.0 %
②	令和4年度 三遠南信 矢筈道路建設工事	吉川建設(株)	R4. 8. 1 ~ R7. 3.14	45.7 %
③	令和4年度 三遠南信 氏乗道路建設工事	木下建設(株)	R5. 4. 3 ~ R7. 2.28	42.0 %
④	令和4年度 三遠南信 6号橋鋼上部工事	矢田工業(株)	R5. 2. 14 ~ R6. 7.31	96.1 %
⑤	令和4年度 三遠南信 矢筈工事用道路建設工事	株早野組	R5. 3. 28 ~ R6.10.31	99.9 %
⑥	令和4年度 三遠南信 7号橋下部工事	吉川建設(株)	R5. 4. 3 ~ R7. 2.10	35.5 %
⑦	令和4年度 三遠南信 6号トンネル工事	株大林組	R5. 3. 4 ~ R7. 2.28	36.0 %
⑧	令和4年度 三遠南信 8号橋下部工事	若築建設(株)	R5. 3. 22 ~ R6.11. 2	92.0 %
⑨	令和4年度 三遠南信 富田道路建設工事	株ヤマウラ	R5. 4. 3 ~ R6. 9.13	99.0 %
⑩	令和5年度 三遠南信 3号橋PC上部工事	オリエンタル白石(株)	R5.12. 1 ~ R7. 2.28	11.4 %
⑪	令和5年度 三遠南信 富田道路建設工事	北沢建設(株)	R6. 3. 18 ~ R7. 2.28	16.9 %
⑫	令和5年度 三遠南信 2号トンネル工事	名工建設(株)	R6. 3. 1 ~ R7. 12.26	1.0 %
⑬	令和5年度 三遠南信 飯喬地区道路整備工事	株早野組	R6. 3. 28 ~ R7. 2.28	23.0 %
⑭	令和5年度 三遠南信 氏乗道路建設工事	木下建設(株)	R6. 4. 1 ~ R7. 2.28	0.5 %
⑮	令和5年度 飯田国道管内道路整備工事	木下建設(株)	R6. 4. 1 ~ R7. 2.28	5.0 %



三遠南信工事連絡協議会飯喬道路支部で、左記の看板を作成しました。この看板には、地籍名と地籍ごとに分けた食材（主にフルーツ）の絵が書かれています。Aの上久堅入口からHの矢筈入口まで計8箇所あり、道路沿線の現場入り口に設置し、各現場の場所をわかりやすくしました。

A：上久堅		E：牛首沢	
B：小手沢・大入沢		F：小豆沢	
C：くるみ沢		G：二日洞	
D：雨沢		H：矢筈	



工事箇所見取図

番号	工事名	担当業者	工期	進捗率：7月末
①	平成30年度 三遠南信 池島トンネル本坑工事	(株)安藤・間	H30. 8.10 ~ R7. 3.24	97.4 %
②	平成30年度 三遠南信 小嵐トンネル本坑工事	五洋建設(株)	H30. 8. 9 ~ R6.11.10	99.9 %
③	令和5年度 三遠南信 八重河内道路建設工事	神稲建設(株)	R5. 9. 27 ~ R6. 9.30	98.6 %

【連絡先】

☆ 飯橋道路3工区

吉川建設(株) 三遠南信 7号橋下部工事作業所内

令和6年度 三遠南信工事連絡協議会

飯橋道路支部

TEL 050-5530-4469 FAX 050-5530-4469

E-mail : ys0849@yoshikawaken.co.jp

☆ 青崩峠道路工区

五洋建設(株) 三遠南信 小嵐トンネル本坑工事作業所内

令和6年度 三遠南信工事連絡協議会

青崩峠道路支部

TEL 0260-31-0511 FAX 0260-31-0512

E-mail : hidekazu.aoki@mail.penta-ocean.co.jp

